N.	Descrizione	Fase critica	Inizio fase	Fine fase	Durata	Uomini	U/GG.
	Diagramma di Gantt				43		108
LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA							
1	Allestimento cantiere	X	02/07/18	02/07/18	1	2	2
2	Bonifica serbatoio di gasolio	X	03/07/18	04/07/18	2	3	6
3	Scavi	X	05/07/18	09/07/18	3	3	9
4	Posa tubazioni interrate e a vista gas		10/07/18	11/07/18	2	2	4
5	Rinfianco e rinterro		12/07/18	12/07/18	1	3	3
6	Ripristino pavimentazione esterna		13/07/18	16/07/18	2	2	4
7	Adeguamento impianto		17/07/18	07/08/18	16	3	48
8	Rimozione infissi esterni		08/08/18	10/08/18	3	2	6
9	Montaggio infissi esterni in metallo		13/08/18	27/08/18	10	2	20
10	Interventi vari: camino, cartongesso, ecc.	X	28/08/18	29/08/18	2	2	4
11	Smantellamento cantiere		30/08/18	30/08/18	1	2	2

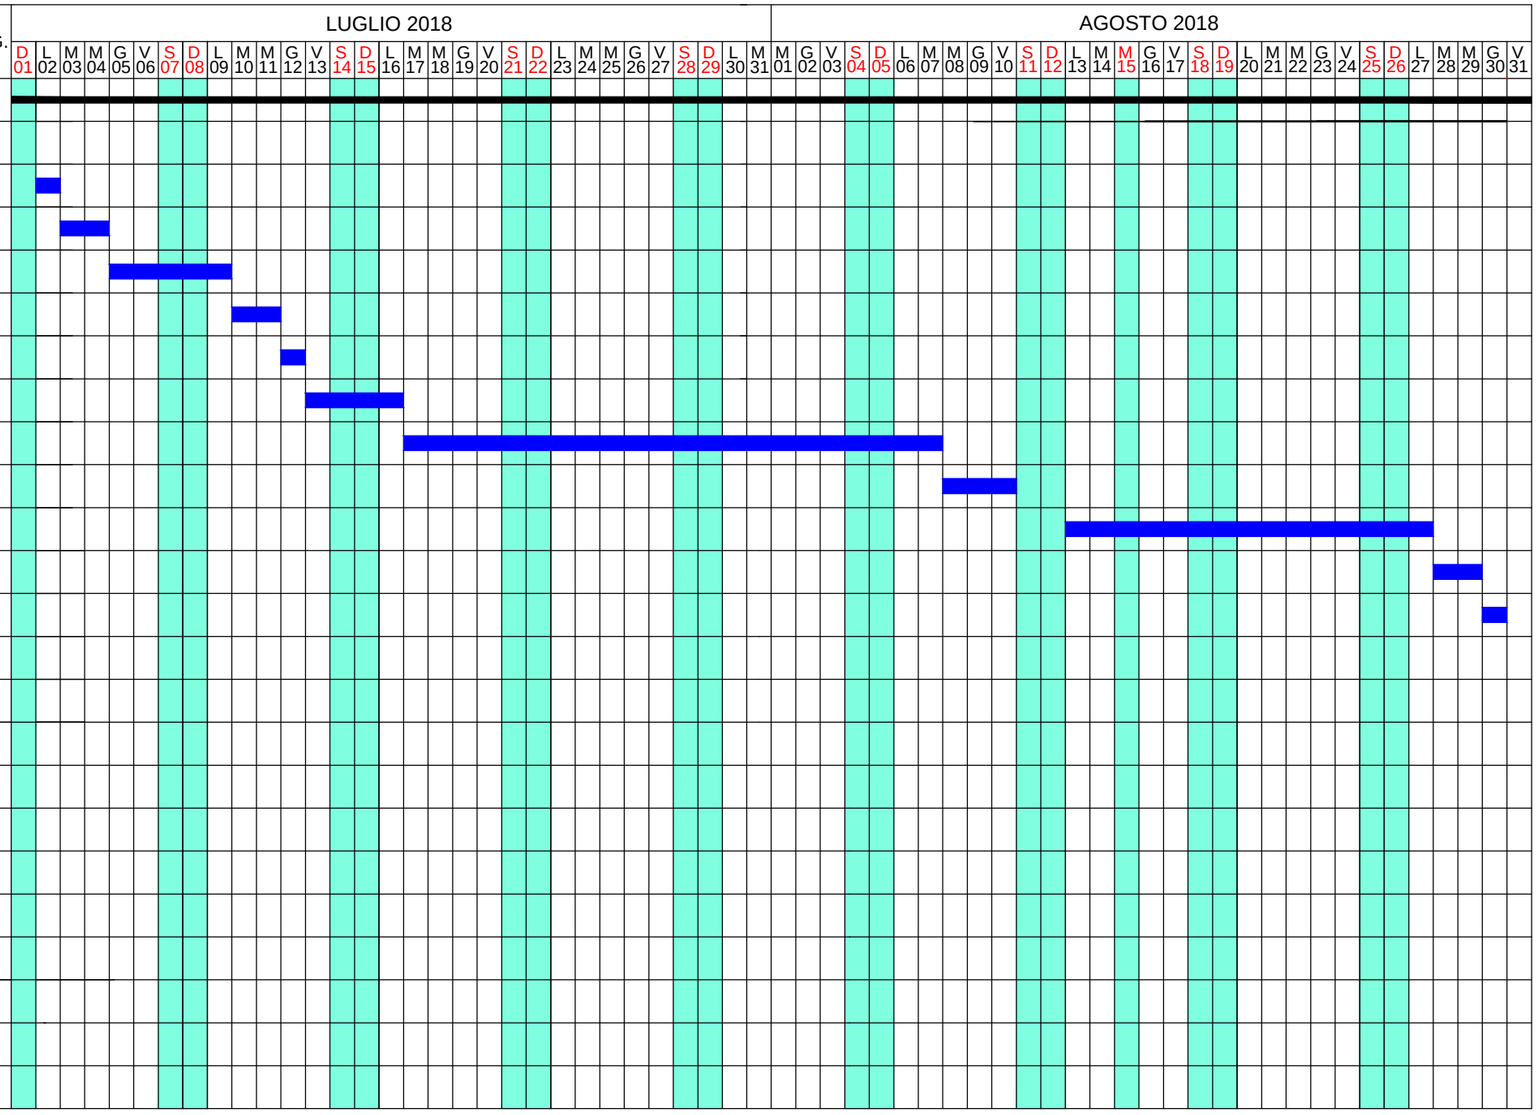

Giorni lavorativi

Giorni festivi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(Diagramma di Gantt)
